

危险性较大设备检测检验项目明细表

单位名称：内蒙古国城实业有限公司

第 1 页 共 2 页

检测项目	检测数量	报告编号	设备型号	检测（使用）地点	检测日期	有效期至	检测结果
绝缘工器具（绝缘手套）	1	安德 JYGJ25/D-0706286	12kV	赤峰安德检测检验有限公司	2025.07.06	2026.01.05	合格
绝缘工器具（绝缘手套）	1	安德 JYGJ25/D-0706287	35kV	赤峰安德检测检验有限公司	2025.07.06	2026.01.05	合格
绝缘工器具（绝缘手套）	1	安德 JYGJ25/D-0706288	35kV	赤峰安德检测检验有限公司	2025.07.06	2026.01.05	合格
绝缘工器具（绝缘手套）	1	安德 JYGJ25/D-0706289	35kV	赤峰安德检测检验有限公司	2025.07.06	2026.01.05	合格
绝缘工器具（绝缘手套）	1	安德 JYGJ25/D-0706290	35kV	赤峰安德检测检验有限公司	2025.07.06	2026.01.05	合格
绝缘工器具（绝缘手套）	1	安德 JYGJ25/D-0706291	35kV	赤峰安德检测检验有限公司	2025.07.06	2026.01.05	合格
绝缘工器具（绝缘手套）	1	安德 JYGJ25/D-0706292	35kV	赤峰安德检测检验有限公司	2025.07.06	2026.01.05	合格
绝缘工器具（绝缘手套）	1	安德 JYGJ25/D-0706293	12kV	赤峰安德检测检验有限公司	2025.07.06	2026.01.05	合格
绝缘工器具（绝缘手套）	1	安德 JYGJ25/D-0706294	12kV	赤峰安德检测检验有限公司	2025.07.06	2026.01.05	合格
绝缘工器具（绝缘靴）	1	安德 JYGJ25/D-0706295	6kV	赤峰安德检测检验有限公司	2025.07.06	2026.01.05	合格
绝缘工器具（绝缘靴）	1	安德 JYGJ25/D-0706296	20kV	赤峰安德检测检验有限公司	2025.07.06	2026.01.05	合格
绝缘工器具（绝缘靴）	1	安德 JYGJ25/D-0706297	20kV	赤峰安德检测检验有限公司	2025.07.06	2026.01.05	合格
绝缘工器具（绝缘靴）	1	安德 JYGJ25/D-0706298	35kV	赤峰安德检测检验有限公司	2025.07.06	2026.01.05	合格
绝缘工器具（绝缘靴）	1	安德 JYGJ25/D-0706299	35kV	赤峰安德检测检验有限公司	2025.07.06	2026.01.05	合格
绝缘工器具（绝缘靴）	1	安德 JYGJ25/D-0706300	35kV	赤峰安德检测检验有限公司	2025.07.06	2026.01.05	合格
绝缘工器具（绝缘靴）	1	安德 JYGJ25/D-0706301	35kV	赤峰安德检测检验有限公司	2025.07.06	2026.01.05	合格
绝缘工器具（绝缘靴）	1	安德 JYGJ25/D-0706302	35kV	赤峰安德检测检验有限公司	2025.07.06	2026.01.05	合格

赤峰安德检测检验有限公司



注：1. 此表呈报应急管理局，请勿遗失。
2. 此表复印无效。



危险性较大设备检测检验项目明细表

单位名称：内蒙古国城实业有限公司

第 2 页 共 2 页

检测项目	检测数量	报告编号	设备型号	检测（使用）地点	检测日期	有效期至	检测结果
绝缘工器具（验电器）	1	安德 JYGJ25/D-0706303	10kV	赤峰安德检测检验有限公司	2025.07.06	2026.07.05	合格
绝缘工器具（验电器）	1	安德 JYGJ25/D-0706304	10kV	赤峰安德检测检验有限公司	2025.07.06	2026.07.05	合格
绝缘工器具（绝缘杆）	1	安德 JYGJ25/D-0706305	10kV	赤峰安德检测检验有限公司	2025.07.06	2026.07.05	合格
绝缘工器具（绝缘杆）	1	安德 JYGJ25/D-0706306	10kV	赤峰安德检测检验有限公司	2025.07.06	2026.07.05	合格
绝缘工器具（绝缘杆）	1	安德 JYGJ25/D-0706307	10kV	赤峰安德检测检验有限公司	2025.07.06	2026.07.05	合格
绝缘工器具（绝缘杆）	1	安德 JYGJ25/D-0706308	10kV	赤峰安德检测检验有限公司	2025.07.06	2026.07.05	合格
绝缘工器具（携带式接地和 接地短路装置）	1	安德 JYGJ25/D-0706309	10kV	赤峰安德检测检验有限公司	2025.07.06	2026.07.05	合格
绝缘工器具 （接地短路装置）	1	安德 JYGJ25/D-0706310	10kV	赤峰安德检测检验有限公司	2025.07.06	2026.07.05	合格
绝缘工器具 （接地短路装置）	1	安德 JYGJ25/D-0706311	10kV	赤峰安德检测检验有限公司	2025.07.06	2026.07.05	合格

赤峰安德检测检验有限公司



注：1. 此表呈报应急管理局，请勿遗失。
2. 此表复印无效。



检测检验报告

委托单位：内蒙古国城实业有限公司

受检单位：内蒙古国城实业有限公司

检测检验类别：定期检测检验

检测检验日期：2025年07月06日

赤峰安德检测检验有限公司





检测设备目录表

序号	设备名称	设备型号	检测报告编号
1	绝缘工器具(绝缘手套)	12kV	安德 JYGJ25/D-0706286
2	绝缘工器具(绝缘手套)	35kV	安德 JYGJ25/D-0706287
3	绝缘工器具(绝缘手套)	35kV	安德 JYGJ25/D-0706288
4	绝缘工器具(绝缘手套)	35kV	安德 JYGJ25/D-0706289
5	绝缘工器具(绝缘手套)	35kV	安德 JYGJ25/D-0706290
6	绝缘工器具(绝缘手套)	35kV	安德 JYGJ25/D-0706291
7	绝缘工器具(绝缘手套)	35kV	安德 JYGJ25/D-0706292
8	绝缘工器具(绝缘手套)	12kV	安德 JYGJ25/D-0706293
9	绝缘工器具(绝缘手套)	12kV	安德 JYGJ25/D-0706294
10	绝缘工器具(绝缘靴)	6kV	安德 JYGJ25/D-0706295
11	绝缘工器具(绝缘靴)	20kV	安德 JYGJ25/D-0706296
12	绝缘工器具(绝缘靴)	20kV	安德 JYGJ25/D-0706297
13	绝缘工器具(绝缘靴)	35kV	安德 JYGJ25/D-0706298
14	绝缘工器具(绝缘靴)	35kV	安德 JYGJ25/D-0706299
15	绝缘工器具(绝缘靴)	35kV	安德 JYGJ25/D-0706300
16	绝缘工器具(绝缘靴)	35kV	安德 JYGJ25/D-0706301
17	绝缘工器具(绝缘靴)	35kV	安德 JYGJ25/D-0706302
18	绝缘工器具(验电器)	10kV	安德 JYGJ25/D-0706303
19	绝缘工器具(验电器)	10kV	安德 JYGJ25/D-0706304
20	绝缘工器具(绝缘杆)	10kV	安德 JYGJ25/D-0706305
21	绝缘工器具(绝缘杆)	10kV	安德 JYGJ25/D-0706306
22	绝缘工器具(绝缘杆)	10kV	安德 JYGJ25/D-0706307
23	绝缘工器具(绝缘杆)	10kV	安德 JYGJ25/D-0706308
24	绝缘工器具(携带式接地和接地短路装置)	10kV	安德 JYGJ25/D-0706309
25	绝缘工器具 (接地短路装置)	10kV	安德 JYGJ25/D-0706310
26	绝缘工器具 (接地短路装置)	10kV	安德 JYGJ25/D-0706311
合计	共 26 份检测报告		



蒙 应急 21 02

报告编号：安德 JYGJ25/D-0706286~0706311

金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具 电气试验报告

委 托 单 位：	内蒙古国城实业有限公司
受 检 单 位：	内蒙古国城实业有限公司
被检对象名称：	绝缘工器具
型 号 规 格：	见各参数页
检测检验类别：	定期检测检验
检测检验日期：	2025 年 07 月 06 日

赤峰安德检测检验有限公司



声 明



- 1、报告中检测检验数据仅对当时设备或来样负责。
- 2、报告中无主检、审核、批准人签字无效。
- 3、报告封面、首页、骑缝未盖“赤峰安德检测检验有限公司检测检验专用章”无效。
- 4、复制报告，封面、首页、骑缝未重新盖“赤峰安德检测检验有限公司检测检验专用章”无效。
- 5、报告涂改无效。
- 6、若对报告有异议，应于收到报告之日起十五日内向检测检验机构提出，逾期视为认可。

检测检验机构名称：赤峰安德检测检验有限公司

检测检验机构地址：内蒙古自治区赤峰市松山区北辰综合批发市场 A 区 5#楼 9 层

邮政编码：024000

电话：0476-5670939

传真：0476-5670939



赤峰安德检测检验有限公司


金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验报告

报告编号：安德 JYGJ25/D-0706286~07062311 第 1 页共 28 页

委托单位	名称	内蒙古国城实业有限公司
	地址	内蒙古自治区乌兰察布市卓资县大榆树乡大苏计村
设备名称		绝缘工器具
设备状态		在用
检测检验类别		定期检测检验
检测检验日期		2025-07-06
检测检验周期		绝缘手套、绝缘鞋（靴）6 个月，其他壹年。
受检单位		内蒙古国城实业有限公司
检测检验项目		工频耐压试验并测泄露电流，起动电压，直流电阻
检测检验依据		KA/T2072-2019《金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验规范》
存在问题及建议		/
检测检验结论		依据 KA/T 2072-2019《金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验规范》要求，对该矿绝缘工器具进行了电气试验。 综合判定：合格  签发日期：2025 年 7 月 14 日
检测检验组成员		杨艳柱 王宇
备注		/

批准：

日期：2025.7.14

审核：

日期：2025.7.14

主检：杨艳柱

日期：2025.7.14

赤峰安德检测检验有限公司

金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验报告

报告编号：安德 JYGJ25/D-0706286~0706311

第 2 页共 28 页

检测检验用仪器设备一览表

名称	设备唯一性编号	准确度	检定/校准证书编号
交直流实验变压器	CSB-058	± 5	WH25D0507074068
温湿度表	CSB-206	精度 (25℃) 温度: $\pm 0.3^{\circ}\text{C}$ (Max $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$) 湿度: $\pm 2\%\text{RH}$ (Max $\pm 5\%\text{RH}$)	WH25D0507074073
钢卷尺	CSB-362	$\pm 1\text{mm}$	OHJ240804530005
数显交流微安表	CSB-379	$U_{\text{rel}}=2.5\%$	DW007-250875865
电子秒表	CSB-370	$\pm 0.02\text{s}$	OYM240804530013

本页结束以下空白

4 3 6 1 2 5



金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验报告

报告编号：安德 JYGJ25/D-0706286

第 3 页共 28 页

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘手套	规格	12kV
件数	1 付	试样编号	J0706286
检测检验（使用）地点	赤峰安德检测检验有限公司		

检测检验环境数据

环境温度（℃）	27.2
环境湿度（%RH）	47.8

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编号	技术要求	实 测 值			结果
		耐压试验 (kV)	持续时间 (min)	泄露电流 (mA)	
J0706286-左	定期检测检验，工频耐压为 8kV 持续时间为 1min。 无击穿现象，泄露电流不大于 9mA。	8	1	4.4	合格
J0706286-右		8	1	4.1	合格

金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验报告

报告编号：安德 JYGJ25/D-0706287

第 4 页共 28 页

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘手套	规格	35kV
件数	1 付	试样编号	J0706287
检测检验（使用）地点	赤峰安德检测检验有限公司		

检测检验环境数据

环境温度（℃）	27.2
环境湿度（%RH）	47.8

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编号	技术要求	实 测 值			结果
		耐压试验 (kV)	持续时间 (min)	泄露电流 (mA)	
J0706287-左	定期检测检验，工频耐压 为 8kV 持续时间为 1min。 无击穿现象，泄露电流不 大于 9mA。	8	1	4.2	合格
J0706287-右		8	1	3.9	合格

本报告结束

金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验报告

报告编号：安德 JYGJ25/D-0706288

第 5 页共 28 页

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘手套	规格	35kV
件数	1 付	试样编号	J0706288
检测检验（使用）地点	赤峰安德检测检验有限公司		

检测检验环境数据

环境温度（℃）	27.2
环境湿度（%RH）	47.8

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编号	技术要求	实 测 值			结果
		耐压试验 (kV)	持续时间 (min)	泄露电流 (mA)	
J0706288-左	定期检测检验，工频耐压为 8kV 持续时间为 1min。无击穿现象，泄露电流不大于 9mA。	8	1	4.7	合格
J0706288-右		8	1	4.2	合格

本报告结束

金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验报告

报告编号：安德 JYGJ25/D-0706289

第 6 页共 28 页

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘手套	规格	35kV
件数	1 付	试样编号	J0706289
检测检验（使用）地点	赤峰安德检测检验有限公司		

检测检验环境数据

环境温度（℃）	27.2
环境湿度（%RH）	47.8

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编号	技术要求	实 测 值			结果
		耐压试验 (kV)	持续时间 (min)	泄露电流 (mA)	
J0706289-左	定期检测检验，工频耐压 为 8kV 持续时间为 1min。 无击穿现象，泄露电流不 大于 9mA。	8	1	3.5	合格
J0706289-右		8	1	3.6	合格

本报告结束

金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验报告

报告编号：安德 JYGJ25/D-0706290

第 7 页共 28 页

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘手套	规格	35kV
件数	1 付	试样编号	J0706290
检测检验（使用）地点	赤峰安德检测检验有限公司		

检测检验环境数据

环境温度（℃）	27.2
环境湿度（%RH）	47.8

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编号	技术要求	实 测 值			结果
		耐压试验 (kV)	持续时间 (min)	泄露电流 (mA)	
J0706290-左	定期检测检验，工频耐压为 8kV 持续时间为 1min。 无击穿现象，泄露电流不大于 9mA。	8	1	4.0	合格
J0706290-右		8	1	3.5	合格

本报告结束

金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验报告

报告编号：安德 JYGJ25/D-0706291

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘手套	规格	35kV
件数	1 付	试样编号	J0706291
检测检验（使用）地点	赤峰安德检测检验有限公司		

检测检验环境数据

环境温度（℃）	27.2
环境湿度（%RH）	47.8

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编号	技术要求	实 测 值			结果
		耐压试验 (kV)	持续时间 (min)	泄露电流 (mA)	
J0706291-左	定期检测检验，工频耐压为8kV 持续时间为1min。 无击穿现象，泄露电流不大于 9mA。	8	1	3.5	合格
J0706291-右		8	1	3.7	合格

金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验报告

报告编号：安德 JYGJ25/D-0706292

第 9 页共 28 页

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘手套	规格	35kV
件数	1 付	试样编号	J0706292
检测检验（使用）地点	赤峰安德检测检验有限公司		

检测检验环境数据

环境温度（℃）	27.2
环境湿度（%RH）	47.8

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编号	技术要求	实 测 值			结果
		耐压试验 (kV)	持续时间 (min)	泄露电流 (mA)	
J0706292-左	定期检测检验，工频耐压 为 8kV 持续时间为 1min。 无击穿现象，泄露电流不 大于 9mA。	8	1	3.4	合格
J0706292-右		8	1	3.2	合格

本报告结束

金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验报告

报告编号：安德 JYGJ25/D-0706293

第 10 页共 28 页

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘手套	规格	12kV
件数	1 付	试样编号	J0706293
检测检验（使用）地点	赤峰安德检测检验有限公司		

检测检验环境数据

环境温度（℃）	27.2
环境湿度（%RH）	47.8

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编号	技术要求	实 测 值			结果
		耐压试验 (kV)	持续时间 (min)	泄露电流 (mA)	
J0706293-左	定期检测检验，工频耐压 为 8kV 持续时间为 1min。 无击穿现象，泄露电流不 大于 9mA。	8	1	3.5	合格
J0706293-右		8	1	3.0	合格

金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验报告

报告编号：安德 JYGJ25/D-0706294

第 11 页共 28 页

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘手套	规格	12kV
件数	1 付	试样编号	J0706294
检测检验（使用）地点	赤峰安德检测检验有限公司		

检测检验环境数据

环境温度（℃）	27.2
环境湿度（%RH）	47.8

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编号	技术要求	实 测 值			结果
		耐压试验 (kV)	持续时间 (min)	泄露电流 (mA)	
J0706294-左	定期检测检验，工频耐压为8kV持续时间为1min。 无击穿现象，泄露电流不大于9mA。	8	1	3.8	合格
J0706294-右		8	1	4.0	合格

本报告结束

金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验报告

报告编号：安德 JYGJ25/D-0706295

第 12 页共 28 页

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘靴	规格	6kV
件数	1 双	试样编号	J0706295
检测检验（使用）地点	赤峰安德检测检验有限公司		

检测检验环境数据

环境温度（℃）	27.2
环境湿度（%RH）	47.8

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编号	技术要求					实 测 值			结果
	按下表规定的试验电压值和持续时间进行工频耐压试验，试验持续时间为 1min；无击穿。泄露电流不大于下表规定值。					耐压试验 (kV)	持续时间 (min)	泄漏电流 (mA)	
	试验类别	电绝缘鞋分类	试验电压 (kV)	持续时间 (min)	泄露电流 (mA)				
J0706295-左	定期检测	全橡胶胶鞋（靴）	15	1	≤6.0	15	1	2.7	合格
J0706295-右		全橡胶胶鞋（靴）	15	1	≤6.0	15	1	2.2	合格

本报告结束

金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验报告

报告编号：安德 JYGJ25/D-0706296

第 13 页共 28 页

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘靴	规格	20kV
件数	1 双	试样编号	J0706296
检测检验（使用）地点	赤峰安德检测检验有限公司		

检测检验环境数据

环境温度（℃）	27.2
环境湿度（%RH）	47.8

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编号	技术要求					实 测 值			结果
	按下表规定的试验电压值和持续时间进行工频耐压试验，试验持续时间为 1min；无击穿。泄露电流不大于下表规定值。					耐压试验 (kV)	持续时间 (min)	泄漏电流 (mA)	
	试验类别	电绝缘鞋分类	试验电压 (kV)	持续时间 (min)	泄露电流 (mA)				
J0706296-左	定期检测	全橡胶胶鞋（靴）	15	1	≤6.0	15	1	2.2	合格
J0706296-右		全橡胶胶鞋（靴）	15	1	≤6.0	15	1	2.0	合格

本报告结束

金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验报告

报告编号：安德 JYGJ25/D-0706297

第 14 页共 28 页

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘靴	规格	20kV
件数	1 双	试样编号	J0706297
检测检验（使用）地点	赤峰安德检测检验有限公司		

检测检验环境数据

环境温度（℃）	27.2
环境湿度（%RH）	47.8

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编号	技术要求					实 测 值			结果
	按下表规定的试验电压值和持续时间进行工频耐压试验，试验持续时间为 1min；无击穿。泄露电流不大于下表规定值。					耐压试验 (kV)	持续时间 (min)	泄漏电流 (mA)	
	试验类别	电绝缘鞋分类	试验电压 (kV)	持续时间 (min)	泄露电流 (mA)				
J0706297-左	定期检测	全橡胶胶鞋（靴）	15	1	≤6.0	15	1	2.3	合格
J0706297-右		全橡胶胶鞋（靴）	15	1	≤6.0	15	1	2.1	合格

本报告结束

金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验报告

报告编号：安德 JYGJ25/D-0706298

第 15 页共 28 页

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘靴	规格	35kV
件数	1 双	试样编号	J0706298
检测检验（使用）地点	赤峰安德检测检验有限公司		

检测检验环境数据

环境温度（℃）	27.2
环境湿度（%RH）	47.8

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编号	技术要求					实 测 值			结果
	按下表规定的试验电压值和持续时间进行工频耐压试验，试验持续时间为 1min；无击穿。泄露电流不大于下表规定值。					耐压试验 (kV)	持续时 间 (min)	泄漏电流 (mA)	
	试验类别	电绝缘鞋分类	试验电压 (kV)	持续时间 (min)	泄露电流 (mA)				
J0706298-左	定期检测	全橡胶胶鞋（靴）	15	1	≤6.0	15	1	2.1	合格
J0706298-右		全橡胶胶鞋（靴）	15	1	≤6.0	15	1	1.8	合格

本报告结束

金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验报告

报告编号：安德 JYGJ25/D-0706299

第 16 页共 28 页

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘靴	规格	35kV
件数	1 双	试样编号	J0706299
检测检验（使用）地点	赤峰安德检测检验有限公司		

检测检验环境数据

环境温度（℃）	27.2
环境湿度（%RH）	47.8

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编号	技术要求					实 测 值			结果
	按下表规定的试验电压值和持续时间进行工频耐压试验，试验持续时间为 1min；无击穿。泄露电流不大于下表规定值。					耐压试验 (kV)	持续时间 (min)	泄漏电流 (mA)	
	试验类别	电绝缘鞋分类	试验电压 (kV)	持续时间 (min)	泄露电流 (mA)				
J0706299-左	定期检测	全橡胶胶鞋（靴）	15	1	≤6.0	15	1	2.2	合格
J0706299-右		全橡胶胶鞋（靴）	15	1	≤6.0	15	1	2.3	合格

本报告结束

金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验报告

报告编号：安德 JYGJ25/D-0706300

第 17 页共 28 页

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘靴	规格	35kV
件数	1 双	试样编号	J0706300
检测检验（使用）地点	赤峰安德检测检验有限公司		

检测检验环境数据

环境温度（℃）	27.2
环境湿度（%RH）	47.8

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编号	技术要求					实 测 值			结果
	按下表规定的试验电压值和持续时间进行工频耐压试验，试验持续时间为 1min；无击穿。泄露电流不大于下表规定值。					耐压试验(kV)	持续时间(min)	泄漏电流(mA)	
	试验类别	电绝缘鞋分类	试验电压(kV)	持续时间(min)	泄露电流(mA)				
J0706300-左	定期检测	全橡胶胶鞋(靴)	15	1	≤6.0	15	1	2.0	合格
J0706300-右		全橡胶胶鞋(靴)	15	1	≤6.0	15	1	1.9	合格

本报告结束

金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验报告

报告编号：安德 JYGJ25/D-0706301

第 18 页共 28 页

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘靴	规格	35kV
件数	1 双	试样编号	J0706301
检测检验（使用）地点	赤峰安德检测检验有限公司		

检测检验环境数据

环境温度（℃）	27.2
环境湿度（%RH）	47.8

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编号	技术要求					实 测 值			结果
	按下表规定的试验电压值和持续时间进行工频耐压试验，试验持续时间为 1min；无击穿。泄露电流不大于下表规定值。					耐压试验(kV)	持续时 间(min)	泄漏电流 (mA)	
	试验类别	电绝缘鞋分类	试验电压 (kV)	持续时间 (min)	泄露电流 (mA)				
J0706301-左	定期 检测	全橡胶胶鞋 (靴)	15	1	≤6.0	15	1	2.3	合格
J0706301-右		全橡胶胶鞋 (靴)	15	1	≤6.0	15	1	2.2	合格

本报告结束

金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验报告

报告编号：安德 JYGJ25/D-0706302

第 19 页共 28 页

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘靴	规格	35kV
件数	1 双	试样编号	J0706302
检测检验（使用）地点	赤峰安德检测检验有限公司		

检测检验环境数据

环境温度（℃）	27.2
环境湿度（%RH）	47.8

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编号	技术要求					实 测 值			结果
	按下表规定的试验电压值和持续时间进行工频耐压试验，试验持续时间为 1min；无击穿。泄露电流不大于下表规定值。					耐压试验 (kV)	持续时间 (min)	泄漏电流 (mA)	
	试验类别	电绝缘鞋分类	试验电压 (kV)	持续时间 (min)	泄露电流 (mA)				
J0706302-左	定期检测	全橡胶胶鞋（靴）	15	1	≤6.0	15	1	2.1	合格
J0706302-右		全橡胶胶鞋（靴）	15	1	≤6.0	15	1	2.0	合格

金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验报告

报告编号：安德 JYGJ25/D-0706303

第 20 页共 28 页

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	验电器	规格	10kV
件数	1 件	试样编号	J0706303
检测检验（使用）地点	赤峰安德检测检验有限公司		

检测检验环境数据

环境温度（℃）	27.2
环境湿度（%RH）	47.8

检测检验项目及结果

起动电压 1600 V

工频耐压

编号	电压等级（kV）	技术要求	实 测 值			结果								
			工频耐压（kV）	试验长度（m）	持续时间（min）									
J07063 03	10	验电器按下表规定值进行工频耐压试验，持续时间为 1min；无闪络或击穿，试样各部分应无灼伤，无发热现象。	45	0.7	1	合格								
		<table><tr><td>额定电压（kV）</td><td>工频耐压试验电压（kV）</td><td>试验长度（m）</td><td>持续时间（min）</td></tr><tr><td>6~10</td><td>45</td><td>0.7</td><td>1</td></tr></table>					额定电压（kV）	工频耐压试验电压（kV）	试验长度（m）	持续时间（min）	6~10	45	0.7	1
		额定电压（kV）					工频耐压试验电压（kV）	试验长度（m）	持续时间（min）					
		6~10					45	0.7	1					
验电器起动电压值为 0.15~0.4 倍额定电压之间。														

金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验报告

报告编号：安德 JYGJ25/D-0706304

第 21 页共 28 页

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	验电器	规格	10kV
件数	1 件	试样编号	J0706304
检测检验（使用）地点	赤峰安德检测检验有限公司		

检测检验环境数据

环境温度（℃）	27.2
环境湿度（%RH）	47.8

检测检验项目及结果

起动电压 1600 V

工频耐压

编号	电压等级（kV）	技术要求	实 测 值			结果								
			工频耐压（kV）	试验长度（m）	持续时间（min）									
J07063 04	10	验电器按下表规定值进行工频耐压试验，持续时间为 1min；无闪络或击穿，试样各部分应无灼伤，无发热现象。	45	0.7	1	合格								
		<table><tr><td>额定电压（kV）</td><td>工频耐压试验电压（kV）</td><td>试验长度（m）</td><td>持续时间（min）</td></tr><tr><td>6~10</td><td>45</td><td>0.7</td><td>1</td></tr></table>					额定电压（kV）	工频耐压试验电压（kV）	试验长度（m）	持续时间（min）	6~10	45	0.7	1
		额定电压（kV）					工频耐压试验电压（kV）	试验长度（m）	持续时间（min）					
		6~10					45	0.7	1					
验电器起动电压值为 0.15~0.4 倍额定电压之间。														

本报告结束

金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验报告

报告编号：安德 JYGJ25/D-0706305

第 22 页共 28 页

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘杆	规格	10kV
件数	1 组 3 节 5 米	试样编号	J0706305
检测检验（使用）地点	赤峰安德检测检验有限公司		

检测检验环境数据

环境温度（℃）	27.2
环境湿度（%RH）	47.8

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编号	额定电压 (kV)	技术要求	实 测 值			结果									
			工频耐 压 (kV)	试验长 度 (m)	持续时 间 (min)										
J07063 05-1	10	绝缘杆（拉杆）按下表规定值进行 工频耐压试验，持续时间为 1min； 无闪络或击穿，试样各部分应无灼 伤，无发热现象。	45	0.7	1	合格									
			45	0.7	1	合格									
J07063 05-2	10		<table><tr><td>额定 电压 (kV)</td><td>工频耐 压试验 电压 (kV)</td><td>试验 长度 (m)</td><td>持续时 间 (min)</td></tr><tr><td>6~10</td><td>45</td><td>0.7</td><td>1</td></tr></table>	额定 电压 (kV)	工频耐 压试验 电压 (kV)	试验 长度 (m)	持续时 间 (min)	6~10	45	0.7	1	45	0.7	1	合格
			额定 电压 (kV)	工频耐 压试验 电压 (kV)	试验 长度 (m)	持续时 间 (min)									
6~10	45	0.7	1												
			45	0.7	1	合格									
J07063 05-3	10		45	0.7	1	合格									
			45	0.7	1	合格									

本报告结束

金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验报告

报告编号：安德 JYGJ25/D-0706306第 23 页共 28 页

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘杆	规格	10kV
件数	1 组 4 节 6 米	试样编号	J0706306
检测检验（使用）地点	赤峰安德检测检验有限公司		

检测检验环境数据

环境温度（℃）	27.2
环境湿度（%RH）	47.8

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编号	额定电压 (kV)	技术要求	实 测 值			结果				
			工频耐 压(kV)	试验长 度 (m)	持续时 间(min)					
J07063 06-1	10	绝缘杆（拉杆）按下表规定值进行 工频耐压试验，持续时间为 1min； 无闪络或击穿，试样各部分应无灼 伤，无发热现象。		45	0.7	1	合格			
				45	0.7	1	合格			
J07063 06-2	10		额定 电压 (kV)	工频耐 压试验 电压 (kV)	试验长 度 (m)	持续时 间 (min)	45	0.7	1	合格
							45	0.7	1	合格
J07063 06-3	10		6~10	45	0.7	1	45	0.7	1	合格
							45	0.7	1	合格
J07063 06-4	10						45	0.7	1	合格
							45	0.7	1	合格

金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验报告

报告编号：安德 JYGJ25/D-0706307

第 24 页共 28 页

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘杆	规格	10kV
件数	1 组 4 节 5 米	试样编号	J0706307
检测检验（使用）地点	赤峰安德检测检验有限公司		

检测检验环境数据

环境温度（℃）	27.2
环境湿度（%RH）	47.8

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编号	额定电压 (kV)	技术要求	实 测 值			结果
			工频耐 压 (kV)	试验长 度 (m)	持续时 间 (min)	
J07063 07-1	10	绝缘杆（拉杆）按下表规定值进行 工频耐压试验，持续时间为 1min； 无闪络或击穿，试样各部分应无灼 伤，无发热现象。	45	0.7	1	合格
			45	0.7	1	合格
J07063 07-2	10		45	0.7	1	合格
			45	0.7	1	合格
J07063 07-3	10		45	0.7	1	合格
			45	0.7	1	合格
J07063 07-4	10	45	0.7	1	合格	
		45	0.7	1	合格	

本报告结束

金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验报告

报告编号：安德 JYGJ25/D-0706308

第 25 页共 28 页

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘杆	规格	10kV
件数	1 组 4 节 5 米	试样编号	J0706308
检测检验（使用）地点	赤峰安德检测检验有限公司		

检测检验环境数据

环境温度（℃）	27.2
环境湿度（%RH）	47.8

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编号	额定电压 (kV)	技术要求	实 测 值			结果									
			工频耐 压(kV)	试验长 度 (m)	持续时 间(min)										
J07063 08-1	10	绝缘杆（拉杆）按下表规定值进行 工频耐压试验，持续时间为 1min； 无闪络或击穿，试样各部分应无灼 伤，无发热现象。		45	0.7	1	合格								
				45	0.7	1	合格								
J07063 08-2	10		<table><tr><td>额定 电压 (kV)</td><td>工频耐 压试验 电压 (kV)</td><td>试验 长度 (m)</td><td>持续时 间 (min)</td></tr><tr><td>6~10</td><td>45</td><td>0.7</td><td>1</td></tr></table>	额定 电压 (kV)	工频耐 压试验 电压 (kV)	试验 长度 (m)	持续时 间 (min)	6~10	45	0.7	1	45	0.7	1	合格
				额定 电压 (kV)	工频耐 压试验 电压 (kV)	试验 长度 (m)	持续时 间 (min)								
6~10	45		0.7	1											
	45		0.7	1	合格										
J07063 08-3	10			45	0.7	1	合格								
				45	0.7	1	合格								
J07063 08-4	10		45	0.7	1	合格									
			45	0.7	1	合格									

赤峰安德检测检验有限公司

金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验报告

报告编号：安德 JYGJ25/D-0706309

第 26 页共 28 页

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	携带式接地和接地短路装置		规格	10kV
件数	1 组	试样编号	J0706309	
检测检验（使用）地点	赤峰安德检测检验有限公司			

检测检验环境数据

环境温度（℃）	27.2	环境湿度（%RH）	47.8
---------	------	-----------	------

测检验项目及结果

1. 成组直流电阻试验

编号	试验电 流等级 ≥30(A)	短路接 地线规 格 mm ²	技术要求		实 测 值			结果
					接线鼻与 接地端接 线鼻的长 度（m）	直流电阻 值（Ω）	每米平均 电阻值 （Ω）	
J070630 9-0	31	25	成组直流电阻应小于下表规定：短路接地线阻值		15	5.4×10^{-4}	0.36×10^{-4}	合格
			短路接地线 规格（mm ² ）	每米的电 阻值（Ω）				
			25	7.9×10^{-4}				

2. 工频耐压试验

编号	电压等 级（kV）	技术要求				实 测 值			结果
						工频耐 压（kV）	试验长 度（m）	持续时间 （min）	
J07063 09-1	10	携带式接地和接地短路装置按下表规定值进行工频耐压试验，持续时间为 1min；无闪络或击穿，试样各部分应无灼伤，无发热现象。				45	0.7	1	合格
J07063 09-2	10	额定 电压 （kV）	工频耐压 试验电压 （kV）	试验 长度 （m）	持续时 间（min）	45	0.7	1	合格
J07063 09-3	10	6~10	45	0.7	1	45	0.7	1	合格

赤峰安德检测检验有限公司

金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验报告

报告编号：安德 JYGJ25/D-0706310

第 27 页共 28 页

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	接地短路装置		规格	10kV
件数	1 组	试样编号	J0706310	
检测检验（使用）地点	赤峰安德检测检验有限公司			

检测检验环境数据

环境温度（℃）	27.2	环境湿度（%RH）	47.8
---------	------	-----------	------

测检验项目及结果

1. 成组直流电阻试验

编号	试验电 流等级 ≥30(A)	短路接 地线规 格 mm ²	技术要求		实 测 值			结果
					接线鼻与 接地端接 线鼻的长 度（m）	直流电阻 值（Ω）	每米平均 电阻值 （Ω）	
J070631 0-0	31	25	成组直流电阻应小于下表规定：短路接地线阻值		8	2.24×10 ⁻⁴	0.28×10 ⁻⁴	合格
			短路接地线 规格（mm ² ）	每米的电 阻值（Ω）				
			25	7.9×10 ⁻⁴				

本报告结束

赤峰安德检测检验有限公司

金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验报告

报告编号：安德 JYGJ25/D-0706311

第 28 页共 28 页

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	接地短路装置		规格	10kV
件数	1 组	试样编号	J0706311	
检测检验（使用）地点	赤峰安德检测检验有限公司			

检测检验环境数据



环境温度（℃）	27.2	环境湿度（%RH）	47.8
---------	------	-----------	------

测检验项目及结果

1. 成组直流电阻试验

编号	试验电 流等级 ≥30(A)	短路接 地线规 格 mm ²	技术要求		实 测 值			结果
					接线鼻与 接地端接 线鼻的长 度 (m)	直流电阻 值 (Ω)	每米平均 电阻值 (Ω)	
J070631 1-0	31	25	成组直流电阻应小于下表规定：短路接地线阻值		8	1.68×10 ⁻⁴	0.21×10 ⁻⁴	合格
			短路接地线 规格 (mm ²)	每米的电 阻值 (Ω)				
			25	7.9×10 ⁻⁴				

本报告结束

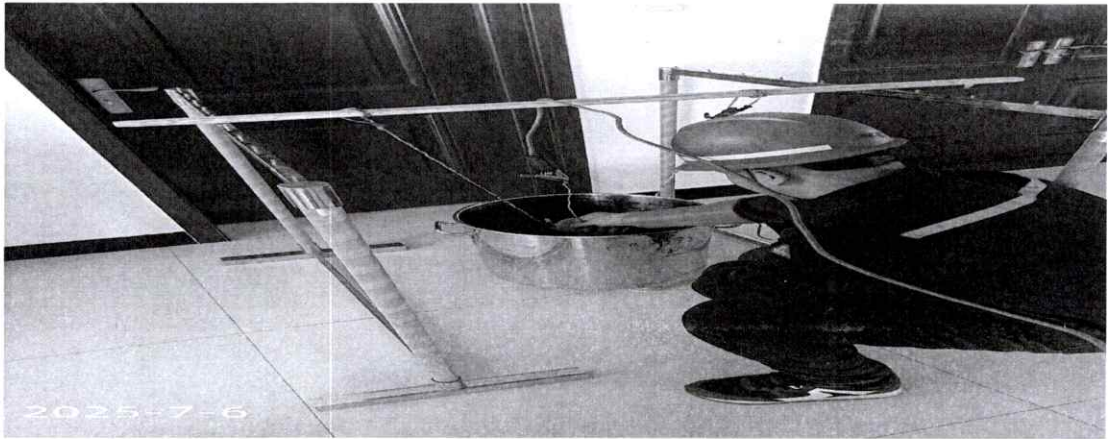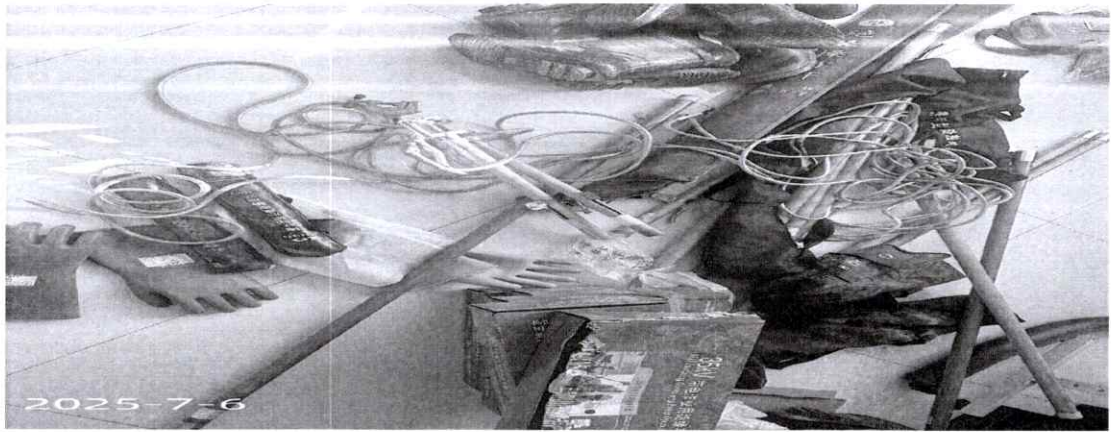

德信检测技术有限公司

100

100
