

# 危险性较大设备检测检验项目明细表

单位名称：克什克腾旗银源矿业公司

| 检测项目      | 检测数量 | 报告编号                | 设备型号 | 检测（使用）地点 | 检测日期       | 有效期至       | 检测结果 |
|-----------|------|---------------------|------|----------|------------|------------|------|
| 提升容器重要承载件 | 1    | 安德 TCZJ25/D-0714014 | /    | SJ4 井口   | 2025.07.14 | 2027.07.13 | 合格   |
| 提升容器重要承载件 | 1    | 安德 TCZJ25/D-0714015 | /    | SJ5 井口   | 2025.07.14 | 2027.07.13 | 合格   |

赤峰安德检测检验有限公司



注：1. 此表呈报应急管理局，请勿遗失。  
2. 此表复印无效。



127

# 检测检验报告

委托单位: 克什克腾旗银源矿业有限公司  
受检单位: 克什克腾旗银源矿业有限公司  
检测检验类别: 定期检测检验  
检测检验日期: 2025 年 07 月 14 日

赤峰安德检测检验有限公司





# 检测设备目录表

| 序号 | 设备名称       | 设备型号 | 报告编号                |
|----|------------|------|---------------------|
| 1  | 提升容器重要承载件  | /    | 安德 TCZJ25/D-0714014 |
| 2  | 提升容器重要承载件  | /    | 安德 TCZJ25/D-0714015 |
| 合计 | 共计 2 份检测报告 |      |                     |



安全生产检测检验资质标志



蒙 应急 21 02

报告编号：安德 TCZJ25/D-0714014

# 提升容器重要承载件无损探伤 安全检测检验报告

委托单位：克什克腾旗银源矿业有限公司  
受检单位：克什克腾旗银源矿业有限公司  
被检对象名称：提升容器重要承载件  
型号规格：/  
检测检验类别：定期检测检验  
检测检验日期：2025 年 07 月 14 日

赤峰安德检测检验有限公司



# 声 明



SO IS 总迎 蒙

- 1、报告中检测检验数据仅对当时设备或来样负责。
- 2、报告中无主检、审核、批准人签字无效。
- 3、报告封面、首页、骑缝未盖“赤峰安德检测检验有限公司检测检验专用章”无效。
- 4、复制报告，封面、首页、骑缝未重新盖“赤峰安德检测检验有限公司检测检验专用章”无效。
- 5、报告涂改无效。
- 6、若对报告有异议，应于收到报告之日起十五日内向检测检验机构提出，逾期视为认可。

检测检验机构名称：赤峰安德检测检验有限公司

检测检验机构地址：内蒙古自治区赤峰市松山区北辰综合批发市场 A 区  
5#楼 9 层

邮政编码：024000

电话：0476-5670939

传真：0476-5670939



## 矿用提升容器重要承载件无损探伤报告

报告编号：安德 TCZJ25/D-0714014

共 3 页第 1 页

|         |    |                                                                                                                                      |        |            |
|---------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|
| 委托单位    | 名称 | 克什克腾旗银源矿业有限公司                                                                                                                        |        |            |
|         | 地址 | 克什克腾旗乌兰布统于家店                                                                                                                         |        |            |
| 设备名称    |    | 提升容器重要承载件                                                                                                                            | 规格型号   | /          |
| 设备状态    |    | 在用                                                                                                                                   |        |            |
| 检测检验地点  |    | SJ4 井口                                                                                                                               | 检测检验日期 | 2025-07-14 |
| 检测检验类别  |    | 定期检测检验                                                                                                                               | 检测检验周期 | 贰年         |
| 受检单位    |    | 克什克腾旗银源矿业有限公司                                                                                                                        |        |            |
| 检测检验项目  |    | 超声波检测                                                                                                                                |        |            |
| 检测检验依据  |    | GB/T 6402-2024 《钢锻件超声检测方法》<br>MT/T 684-1997 《矿用提升容器重要承载件无损探伤方法与验收规范》                                                                 |        |            |
| 存在问题及建议 |    | /                                                                                                                                    |        |            |
| 检测检验结论  |    | 依据标准 GB/T 6402-2024 《钢锻件超声检测方法》、MT/T 684-1997 《矿用提升容器重要承载件无损探伤方法与验收规范》，经检测，在检测区域内未发现超标缺陷。<br><br>综合判定：合格<br><br>签发日期：2025 年 7 月 20 日 |        |            |
| 检测检验组成员 |    | 张洺玮 陈立超 王浩奇 雷宇昕 李承杰                                                                                                                  |        |            |
| 备注      |    | /                                                                                                                                    |        |            |

批准：

日期：2025.7.20

审核：

日期：2025.7.20

主检：

日期：2025.7.20

## 矿用提升容器重要承载件无损探伤报告

报告编号：安德 TCZJ25/D-0714014

共 3 页第 2 页

## 检测检验用仪器设备一览表

| 名称          | 设备唯一性<br>编号 | 准确度（精度）                                                                                                            | 检定/校准证书编号       |
|-------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 超声波探伤<br>仪  | CSB-106     | 垂直线性误差 $\leq 3\%$<br>水平线性误差 $\leq 0.1\%$                                                                           | OYM240804530017 |
| 超声波探伤<br>试块 | /           | /                                                                                                                  | /               |
| 温湿度表        | CSB-205     | 温度： $\pm 0.3^{\circ}\text{C}$ (Max $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$ )<br>湿度： $\pm 2\%\text{RH}$ (Max $\pm 5\%\text{RH}$ ) | 24KA110001664   |


## 检测检验环境数据

|                             |      |
|-----------------------------|------|
| 环境温度 ( $^{\circ}\text{C}$ ) | 23.7 |
| 环境湿度 (%RH)                  | 44.1 |

超声波无损探伤检测数据

|      |                                     |       |                   |
|------|-------------------------------------|-------|-------------------|
| 工件名称 | 提升容器重要承载件                           | 工件材质  | 钢                 |
| 检测方法 | 纵波直入法                               | 样品状态  | 在用                |
| 探伤部位 | 见附图                                 | 扫查方式  | 100%              |
| 探头规格 | 2.5MHz $\phi$ 20<br>2.5MHz 13×13 K2 | 耦合剂   | 机油                |
| 表面状态 | 符合标准要求                              | 检测灵敏度 | $\phi$ 2 mm 平底孔当量 |

附图：

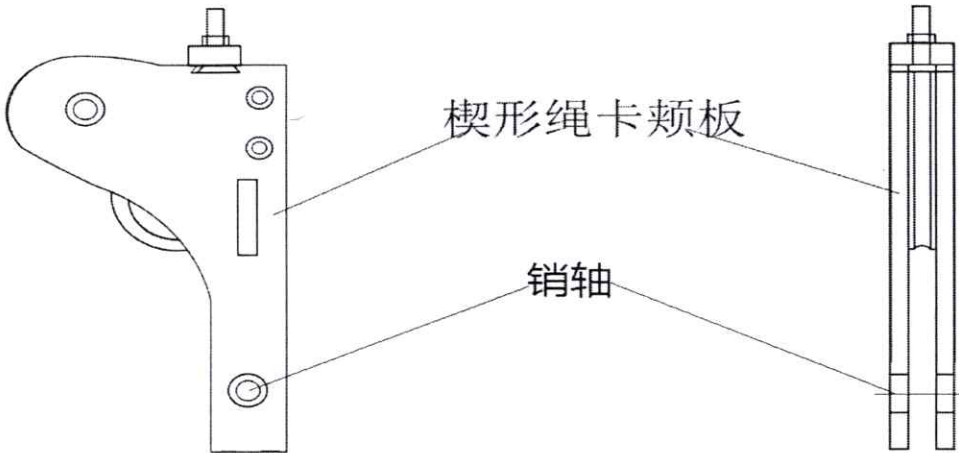

检测检验数据和结果汇总表

| 序号 | X 位置                                    | Y 位置 | 当量大小 | 检测结果 |
|----|-----------------------------------------|------|------|------|
| 1  | /                                       | /    | 无缺陷  | 合格   |
| 备注 | 因设备处于工作状态，无法解体，未裸露部位无法探测。<br>(工件数量：1 件) |      |      |      |

本报告结束

2000

100

100

安全生产检测检验资质标志



蒙 应急 21 02

报告编号：安德 TCZJ25/D-0714015

# 提升容器重要承载件无损探伤 安全检测检验报告

委 托 单 位：克什克腾旗银源矿业有限公司  
受 检 单 位：克什克腾旗银源矿业有限公司  
被检对象名称：提升容器重要承载件  
型 号 规 格：/  
检测检验类别：定期检测检验  
检测检验日期：2025 年 07 月 14 日

赤峰安德检测检验有限公司



# 声 明



- 1、报告中检测检验数据仅对当时设备或来样负责。
- 2、报告中无主检、审核、批准人签字无效。
- 3、报告封面、首页、骑缝未盖“赤峰安德检测检验有限公司检测检验专用章”无效。
- 4、复制报告，封面、首页、骑缝未重新盖“赤峰安德检测检验有限公司检测检验专用章”无效。
- 5、报告涂改无效。
- 6、若对报告有异议，应于收到报告之日起十五日内向检测检验机构提出，逾期视为认可。

检测检验机构名称：赤峰安德检测检验有限公司

检测检验机构地址：内蒙古自治区赤峰市松山区北辰综合批发市场 A 区  
5#楼 9 层

邮政编码：024000

电话：0476-5670939

传真：0476-5670939



## 矿用提升容器重要承载件无损探伤报告

报告编号：安德 TCZJ25/D-0714015

共 3 页第 1 页

|         |    |                                                                                                                                      |        |            |
|---------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|
| 委托单位    | 名称 | 克什克腾旗银源矿业有限公司                                                                                                                        |        |            |
|         | 地址 | 克什克腾旗乌兰布统于家店                                                                                                                         |        |            |
| 设备名称    |    | 提升容器重要承载件                                                                                                                            | 规格型号   | /          |
| 设备状态    |    | 在用                                                                                                                                   |        |            |
| 检测检验地点  |    | SJ5 井口                                                                                                                               | 检测检验日期 | 2025-07-14 |
| 检测检验类别  |    | 定期检测检验                                                                                                                               | 检测检验周期 | 贰年         |
| 受检单位    |    | 克什克腾旗银源矿业有限公司                                                                                                                        |        |            |
| 检测检验项目  |    | 超声波检测                                                                                                                                |        |            |
| 检测检验依据  |    | GB/T 6402-2024 《钢锻件超声检测方法》<br>MT/T 684-1997 《矿用提升容器重要承载件无损探伤方法与验收规范》                                                                 |        |            |
| 存在问题及建议 |    | /                                                                                                                                    |        |            |
| 检测检验结论  |    | 依据标准 GB/T 6402-2024 《钢锻件超声检测方法》、MT/T 684-1997 《矿用提升容器重要承载件无损探伤方法与验收规范》，经检测，在检测区域内未发现超标缺陷。<br><br>综合判定：合格<br><br>签发日期：2025 年 7 月 20 日 |        |            |
| 检测检验组成员 |    | 张洺玮 陈立超 王浩奇 雷宇昕 李承杰                                                                                                                  |        |            |
| 备注      |    | /                                                                                                                                    |        |            |

批准：[Signature]

日期：2025.7.20

审核：张振宇

日期：2025.7.20

主检：[Signature]

日期：2025.7.20

检测检验用仪器设备一览表

| 名称          | 设备唯一性<br>编号 | 准确度（精度）                                                                                                            | 检定/校准证书编号       |
|-------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 超声波探伤<br>仪  | CSB-106     | 垂直线性误差 $\leq 3\%$<br>水平线性误差 $\leq 0.1\%$                                                                           | OYM240804530017 |
| 超声波探伤<br>试块 | /           | /                                                                                                                  | /               |
| 温湿度表        | CSB-205     | 温度： $\pm 0.3^{\circ}\text{C}$ (Max $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$ )<br>湿度： $\pm 2\%\text{RH}$ (Max $\pm 5\%\text{RH}$ ) | 24KA110001664   |


检测检验环境数据

|                             |      |
|-----------------------------|------|
| 环境温度 ( $^{\circ}\text{C}$ ) | 23.1 |
| 环境湿度 (%RH)                  | 43.4 |

超声波无损探伤检测数据

|      |                                     |       |                   |
|------|-------------------------------------|-------|-------------------|
| 工件名称 | 提升容器重要承载件                           | 工件材质  | 钢                 |
| 检测方法 | 纵波直入法                               | 样品状态  | 在用                |
| 探伤部位 | 见附图                                 | 扫查方式  | 100%              |
| 探头规格 | 2.5MHz $\phi$ 20<br>2.5MHz 13×13 K2 | 耦合剂   | 机油                |
| 表面状态 | 符合标准要求                              | 检测灵敏度 | $\phi$ 2 mm 平底孔当量 |

附图：



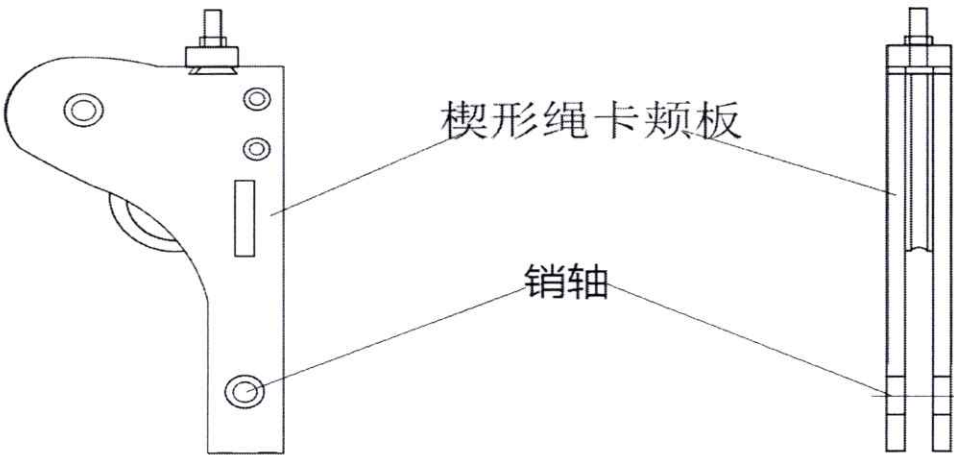


检测检验数据和结果汇总表

| 序号 | X 位置                                    | Y 位置 | 当量大小 | 检测结果 |
|----|-----------------------------------------|------|------|------|
| 1  | /                                       | /    | 无缺陷  | 合格   |
| 备注 | 因设备处于工作状态，无法解体，未裸露部位无法探测。<br>(工件数量：1 件) |      |      |      |

本报告结束



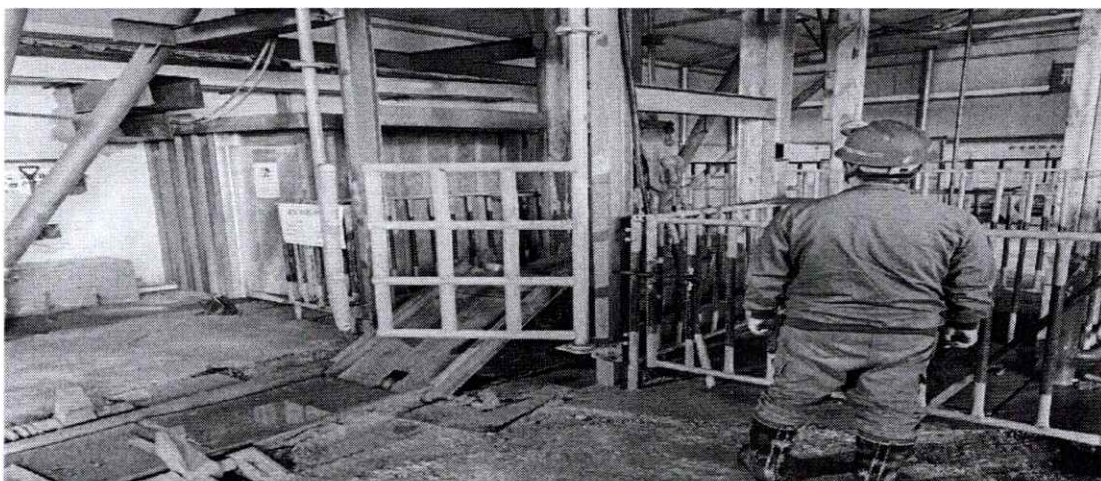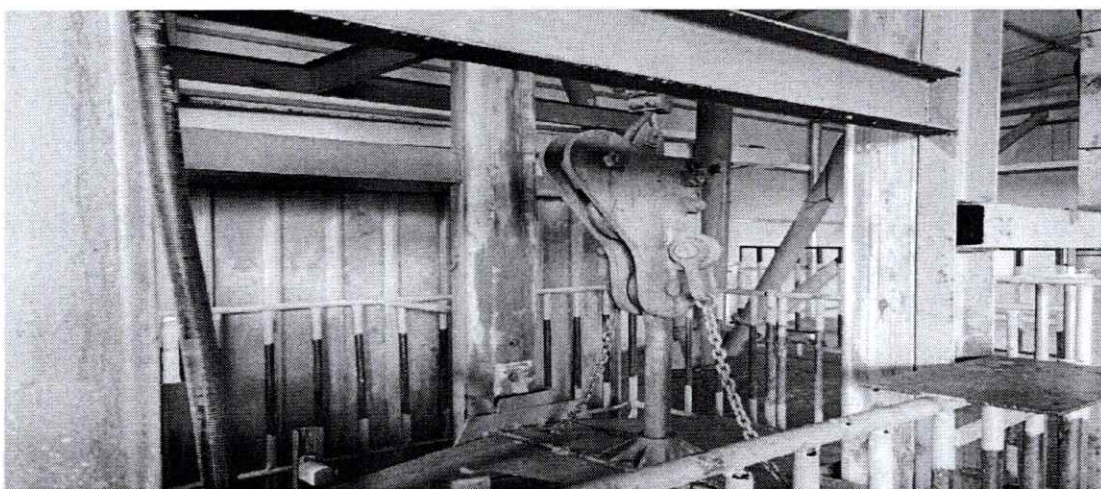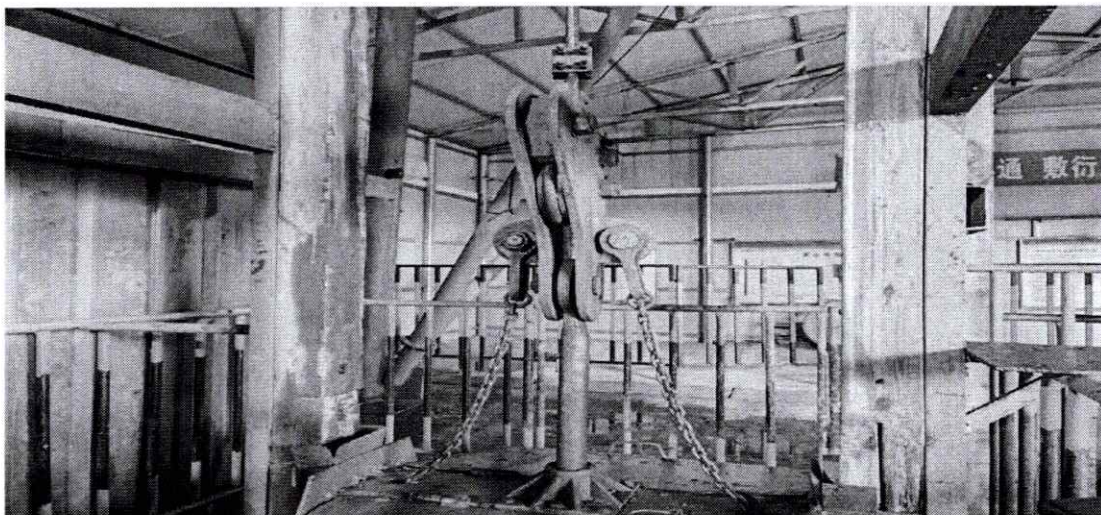

中國機械有限公司  
用章

